


CUENCA DEL RÍO PARAGUAY
INFORME DE SITUACIÓN

Ing, Juan Borús, Lic, Gustavo Almeida, Lic, Leandro Giordano, Lic, Juan Bianchi
13 de Mayo de 2019

Acumulados semanales de lluvia:

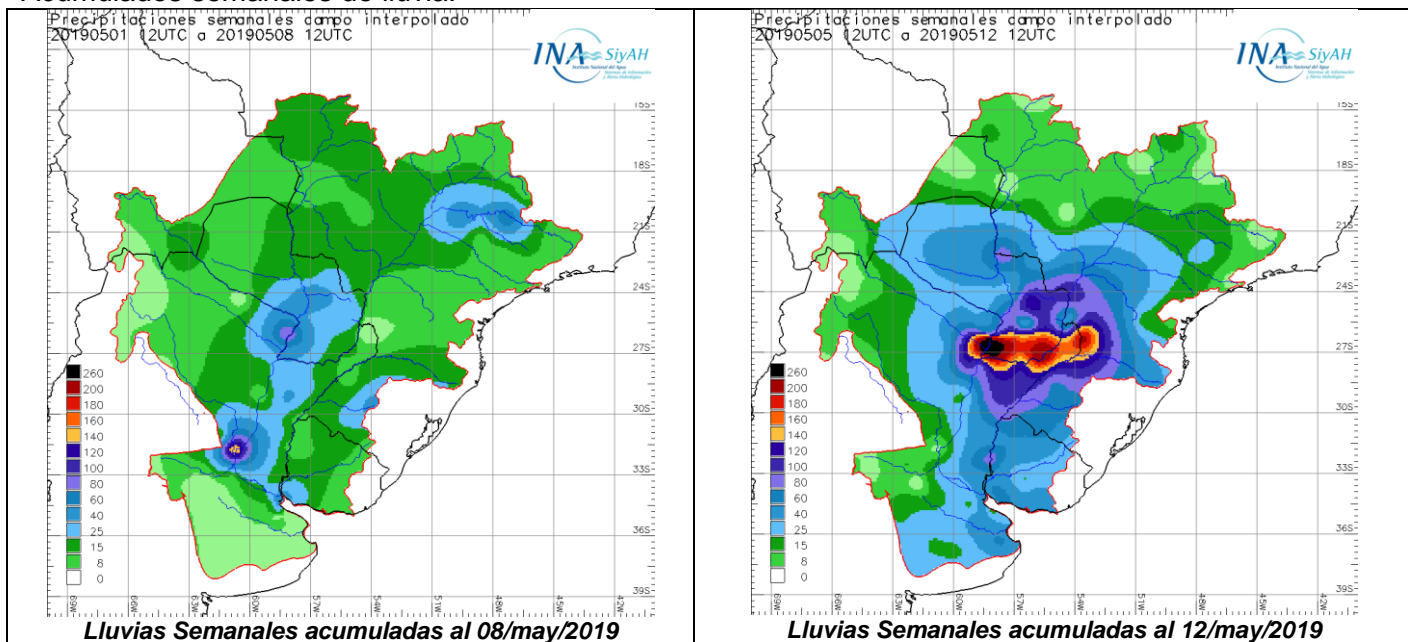

Los niveles esperados son (en metros):

IMPORTANTES APORTES LOCALES AL TRAMO INFERIOR

Mes	Bahía Negra	P. Concepción	P. Pilcomayo (1)	Formosa (2)
HOY	3,74	6,15	7,42	8,85
14/may	3,75	6,13	7,44	8,88
15/may	3,76	6,11	7,45	8,90
16/may	3,77	6,10	7,45	8,92
17/may	3,78	6,05	7,45	8,93
18/may	3,80	6,01	7,44	8,94
19/may	3,82	5,96	7,43	8,94
20/may	3,84	5,92	7,41	8,93
21/may	3,86	5,87	7,40	8,92

(1): descenso retrasado

(2): Sostenido en el pico, no se registraba desde febrero de 2016

Para el recinto de defensa de la ciudad de Formosa se actualiza la condición de las estaciones de bombeo en función del nivel fluvial, actualizando la siguiente tabla:

N° de Orden	Descripcion	Descargador de fondo	Cota Fondo Descargador		Permanencia	
			MOP	L.H.P.F.	Desde	Hasta
1	Estacion de Bombeo Laguna Siam ,c/descargador de Fondo, caño metalico	1 Ø 1,50	51,00	3,70	18-mar-19	SPD
2	Estacion de Bombeo 9 de Julio ,c/descargador de Fondo, caño metalico	2 Ø 1,50	52,20	4,90	23-mar-19	SPD
3	Estacion de Bombeo San Jose Obrero ,c/descargador de Fondo, caño metalico	1 Ø 1,20	52,73	5,43	28-mar-19	SPD
4	Estacion de Bombeo San Agustin 2	1 Ø 0,76	52,96	5,66	30-mar-19	SPD
5	Estacion de Bombeo Belgrano ,c/descargador de Fondo, caño metalico	1 Ø 1,20	53,30	6,00	01-abr-19	02-jul-2019
6	Estacion de Bombeo San Agustin 1 ,c/descargador de Fondo, caño metalico	2 Ø 1,30	53,30	6,00	01-abr-19	02-jul-2019
7	Estacion de Bombeo Zambrini ,c/descargador de Fondo, caño metalico	1 Ø 1,30 3 Ø1,00	53,35	6,05	02-abr-19	30-jun-2019
8	Estacion de Bombeo San Juan Bautista ,c/descargador de Fondo, caño metalico	3 Ø 1,50	53,51	6,21	03-abr-19	26-jun-2019
	Sin designación	H° Armado 1,00	53,60	6,30	04-abr-19	25-jun-2019
9	Estacion de Bombeo San Juan Bautista , Regimiento, c/descargador de Fondo, caño metalico	1 Ø 0,76	54,00	6,70	07-abr-19	19-jun-2019
10	Estacion de Bombeo Bernardino Rivadavia-(Isla de Oro) Electrica, c/descargador de Fondo, caño metalico	1 Ø 1,30	54,00	6,70	07-abr-19	19-jun-2019
11	Estacion de Bombeo Liborsi (Fuera de servicio) ,c/descargador de Fondo, caño metalico	1 Ø 1,20	54,73	7,43	13-abr-19	09-jun-2019
12	Estacion de Bombeo San Juan ,c/descargador de Fondo, caño metalico	1 Ø 1,20	54,84	7,54	14-abr-19	08-jun-2019
13	Estacion de Bombeo La Floresta ,c/descargador de Fondo, caño metalico	1 Ø 1,20	54,85	7,55	14-abr-19	08-jun-2019
14	Estacion de Bombeo Collucio Norte ,c/descargador de Fondo, caño metalico	2 Ø 1,50	55,30	8,00	20-abr-19	04-jun-2019
SPD: Sin pronóstico de desafectación de la estación (horizonte: 31/JUL/2019)						
SPS: Sin pronóstico de superación de dicho nivel de referencia (horizonte: 31/JUL/2019)						

Los niveles medios mensuales esperados son (en metros, horizonte 31/jul/2019):

Mes	Bahía Negra	P. Concepción	P. Pilcomayo	Formosa
MAYO	3,76	5,83	7,28	8,67
JUNIO	4,40	4,60	6,05	6,97
JULIO	4,76	4,18	4,93	5,73

Se sugiere consultar los siguientes productos de imágenes satelitales SENTINEL 1-B:

Máscara de agua: https://alerta.ina.gov.ar/uploaded_files/S1B_20190504_paraguay_mask.png

Detección de cambios: https://alerta.ina.gov.ar/uploaded_files/S1B_20190422vs0504_paraguay_ddc.png

El monitoreo permanente continuará en los próximos días y se informará sobre los cambios en la expectativa y pronósticos hidrométricos. La actualización es diaria. El mensaje completo será preparado el próximo Viernes 17/may/2019 y presentado en la página web.
